

ТСР

Предприятие "Высоковольтные сети"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 февраля

91

27

О включении ЛЭП-6 кВ ф. 5 РП-707К, п/ст. IIУС, СВШ-250, ЭКГ-4,6 Б.

карьера "Фригассовид" г.м.

Для электроснабжения производства работ по отсыпке площадки мебельной фабрики и на основании заявки управляющего трестом "Стройкомплект" т. Пескина В.Ю.

1. Согласовать тресту "Стройкомплект" подключение п/ст. IIУС с трансформатором 180 кВА, экскаваторов СВШ-250, ЭКГ-4,6 Б от яч. 5 РП-707К согласно прилагаемой схеме.

2. Включение под напряжение произвести под ответственность:

2.1. оборудования яч. 5 РП-707К - начальника р-на п/ст. "Кайеркан-Алыкель" т. Подгорнова В.С.;

2.2. оборудования п/ст. IIУС, ЭКГ-4,6 Б, СВШ-250 с питающей ЛЭП-6 кВ ф. 5 РП-707К - энергетика участка № 7 треста "Стройкомплект" т. Вострокнутова А.Э., после получения разрешения инспекции энергонадзора УГЭ.

3. Границу обслуживания электрооборудования между ПВВС и трестом "Стройкомплект" установить на контактах подключения кабеля 6 кВ к оборудованию яч. 5 РП-707К, Контакт на границе раздела обслуживания персонал П В В С.


4. Энергосбыту счет за электроэнергию тресту "Стройкомплект" предъявлять согласно показаний эл. счетчиков яч. 5 РП-707К.

5. С распоряжением ознакомить персонал ДЭС, ПДС, МСРЗА, энерго-сбыта, р-на п/ст. "Кайеркан-Алыкель", треста "Стройкомплект", УГЭ.


Главный инженер П В В С

В.Т.Понкратов

Поплюева
54662



к распоряжению
от 31 февраля 1991г.

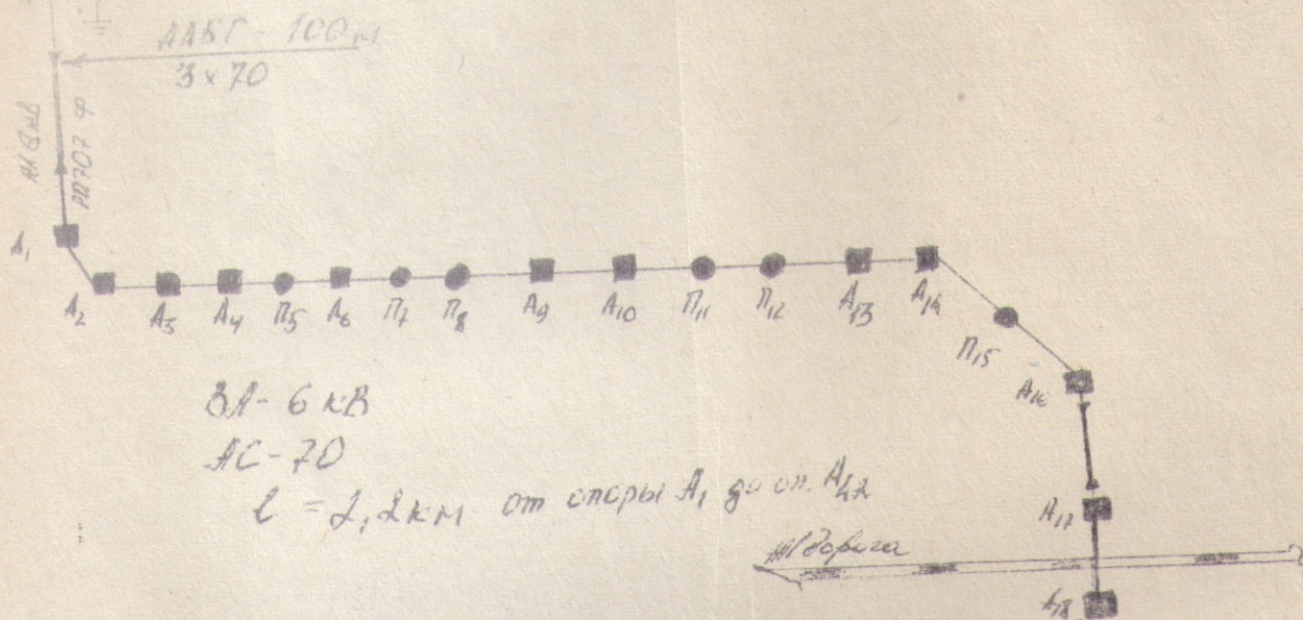


ΔA - 6 кВ

AC - 70

ℓ = 2,2 км от опоры A1 до оп. A12

Подключение
формально после настраи-
ки устройств РЗА и БРП-707
После установки РВНО-6кВ уставки
на РВНО-6кВ согласовать с устави-
ками на БРП-707 по тел. Б-44-56.

11.02.91г. Гудан

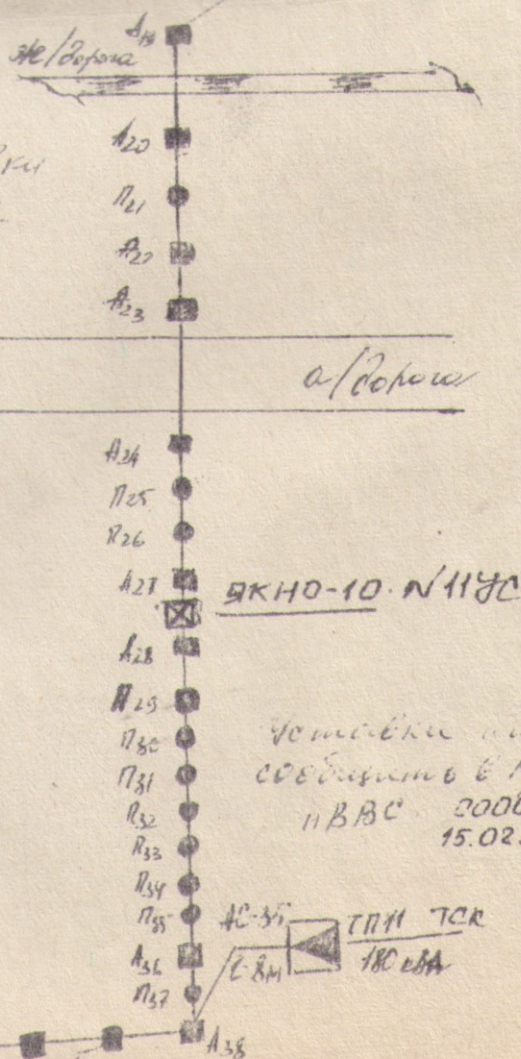

Схему составил:


энергетик ут-ва №7 ТСК

Вострокнутов А.З. Дворец

т. 2-32-93

дд. 01.91г.

Уставки на РВНО-6
соединить с МРЗА
и ВВС сообщены
15.02.91г.



Представляется не позднее чем за 5 суток до подключения в «Высоковольтные сети»

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер (энергетик)
предприятия

КОПИЯ:

Главному инженеру предприятия
«Высоковольтные сети»

Энергонадзору

Ветошкину Р.А.

ЗАЯВКА

на подключение электроустановки

Прошу вас дать разрешение на подключение к

РП 707 ф 5

карьера «Притрассовый»

(указать место подключения: № яч. подстанции или № опоры, № фидера п/ст.)

электроустановки

ТПН-180 кВА, экскаватора ЭМГ-4,65-250 кВт,
бурового станка СБШ250-380 кВ

(тип эл. установки, ее характеристика и мощность)

Для

производства горных работ

(назначение электроустановки)

Однолинейная схема подключаемой электроустановки прилагается. От подключаемой электроустановки будет запитана следующая нагрузка

$P \approx 650 \text{ кВт}$

(трансформаторы, эл. двигатели, освещение, их характеристика и мощность)

Ответственное лицо за эксплуатацию подключаемой электроустановки

энергетик участка № 7 ТСК Вапсковой АЭ № 232-93

(должность, гл. ст. энергетик, ф. и. о., № телефона)

Ответственное лицо предприятия, которое должно быть поставлено в известность за сутки ранее о плановом обеспечении подключаемой эл. установки на период ремонта электрооборудования подстанций и ЛЭП предприятия «Высоковольтные сети».

главный энергетик треста «Стройкомплект»
Щвлев Н.А. № А-68-39

(должность, ф. и. о., № телефона)

Расчет за эл. энергию производится по предъявлении счета.

согласно показаний счетчика

(показания установленных счетчиков или производственных



замеров работниками Энергосистемы)




уполномоченный представитель предприятия

Гл. бухгалтер

от П11707 гл. 5




ВЛВ кВ Провод АС-70
L от оп. А1 до оп. А2 2,2 км




ж/дорога

ж/дорога

а/дорога



Схему составил
энергетик уч-ка №7 ТСК
вострокнутов А.З. 02.01.91.

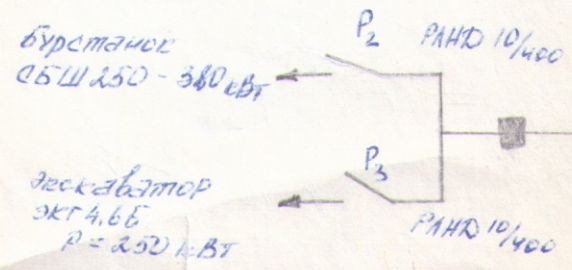

на 1.01.90г.

Лист 81

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I

	м-а.	год.	мск.	наименов.	цена	ко-во	Σ	
Герабад пур	09	1988	74	07237	46,00	1,00	46,00	
ИТОГО ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ:						1,00	46,00	
Атлама А 37/6.	04	1988	74	54012	46,06	7,00	322,42	
ПМЕ-612.	06	1987	74	54484	65,00	2,00	130,00	
Холодильник	12	1988	74	54498	3,93	2,00	7,86	
Пускатель ПНЗ	04	1989	74	54521	17,64	4,00	70,56	
ПМЕ-512	04	1988	74	54522	38,52	2,00	77,04	
Авт. контроль (АВЗ)	05	1989	74	54679	375,00	4,00	1500,00	
Д. двигат.	02	1988	74	54921	46,54	10,00	465,40	
Диск. зеркальный	11	1989	74	55525	0,15	300,00	45,00	
Диск. камен	01	1990	74	55527	0,56	420,00	235,20	
Диск. ДР	11	1989	74	55528	11,42	11,00	125,62	
Уход. карр	01	1989	74	55836	2,40	6,00	14,40	
Пистолет	04	1985	74	56069	0,55	6,00	3,30	
	08	1989	74	58014	76,78	2,00	153,56	
ИТОГО ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ:						776,00	3150,36	
ИЗТ-6кв.	04	1982	74	92104	4036,60	1,00	4036,60	
Диспетчер	06	1987	74	94002	2,98	4,00	11,92	
Водитель	07	1987	74	94073	3,11	3,00	9,33	
	06	1987	74	94074	4,94	1,00	4,94	
Счетчик	06	1987	74	95798	17,75	1,00	17,75	
Аппарат телеф.	12	1988	74	97001	29,90	4,00	119,62	
Ведущий	06	1987	74	97081	18,03	3,00	54,09	
Ведущий	05	1987	74	97907	48,57	1,00	48,57	
Д. к. я. т. б. к.	ИТОГО ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ:						18,00	4302,82
ИТОГО ПО СКЛАДУ :						795,00	7499,18 *	

Входит в учет для сверки
сальдо 1/1-90г. в 1400

Кроме 8657

Риски

770
70588
НОРИЛЬСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И Ордена Трудового Красного Знамени ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ имени А. И. ЗАВЕНЯГИНА

Производственное строительно-монтажное
объединение "Норильскстрой"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1988 г.

г. Норильск

Об установлении задания на 1988 год по сдаче в государственный
фонд серебра в виде лома и отходов

В целях упорядочения работы по учету и списанию аппаратуры
и оборудования, содержащего драгоценные металлы, совершенствова-
ния системы заготовки и предварительной переработки серебросоде-
ржащего лома и безусловного выполнения задания, установленного
объединению "Норильскстрой" комбинатом:

1. Установить план сдачи серебра на 1988 год в виде лома и
отходов от списания электроаппаратуры, оборудования, приборов и
изделий электронной техники:

№ п/п	Наименование предприятия	План сдачи се- ребра в граммах
1	2	3
1	Трест "Промстрой"	2400
2	Домостроительный комбинат	2100
3	Трест "Норильскшахтстрой"	2500
4	Трест "Строймеханизация"	2700
5	Трест "Стройкомплект"	1200
6	Трест-площадка "Горстрой"	700
7	Управление малой механизации	800
8	Автотранспортное предприятие	800
9	ССМУ "Энергомонтаж"	500
10	СУ "Норильскэнергомонтажизоляция"	400
11	СУ "Портстрой"	900

2. Списание электроаппаратуры, приборов и иных изделий, изгото-
вленных с применением серебра производить при условии изъятия
из них серебросодержащих узлов и деталей и оприходованием сереб-
ра в виде лома и отходов (масса серебра указывается по данным
заводов-изготовителей).

3. Отчетным периодом сдачи серебра в виде лома и отходов на накопительные приемные пункты объединения "Норильскстрой" (ННСТ, Стройкомплект) считать с 01.01.88 по 15.10.88, сдача с приемных пунктов объединения в управление снабжения комбината - не позднее 31.10.88.

4. Руководителям предприятий своими приказами назначить лиц, ответственных за организацию бухгалтерского учета и отчетности, своевременность и полноту проведения инвентаризаций изделий, содержащих серебро и образующихся при их списании серебросодержащих отходов (из числа бухгалтерских работников) и лиц, ответственных за организацию работы по сбору, первичной обработке и сдаче на приемные пункты серебра в виде лома и отходов от списания электроаппаратуры, приборов и оборудования (из числа работников энергослужб).

5. Контроль за исполнением распоряжений возложить на зам. главного энергетика объединения В.Л. Иванова.

Зам. начальника объединения

В.С.

исп. Иванов
тел. 5-20-85

27.7

872 Вх 1079
4.07.88г.

ТСК

НОРИЛЬСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ им. А.П. ЗАВЕНЯГИНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Шенгоров М.В.
Директор
688

27 ИЮНЯ 1988 г.

г. Норильск

По организации работ в электроустановках потребителей и мерах по предупреждению электротравматизма в летний период

В связи с ростом случаев электротравматизма на предприятиях Министерства цветной металлургии, а также предприятиях комбината и в соответствии с письмом заместителя министра т. Арбуева К.К. от 03.06.88 № КА-6517/40 решил:

1. Ремонтные работы в электроустановках напряжением 6-35 кВ выполнять по наряду-допуску с назначением ответственного руководителя работ из числа инженерно-технического персонала в следующих случаях:

- 1.1. На сборных линиях главных понизительных подстанциях (ГПП) и распределительных подстанциях (РП).
- 1.2. На вводных и секционных ячейках РП и ГПП.
- 1.3. На присоединениях, имеющих питание от двух источников.
- 1.4. На электрооборудовании присоединений силовых трансформаторов 35 кВ.

2. Запретить выдачу нарядов-допусков на производство работ в электроустановках лицам не инженерно-технического персонала (рабочим).

3. Запретить назначение работников на временное исполнение обязанностей (на период отпуска, болезни и т.д.) без стажировки и сдачи экзаменов в соответствующей комиссии.

4. Руководителям предприятий и организаций:

4.1. Запретить отвлекать квалифицированный электротехнический персонал на работы не по специальности (на уборку мусора и сборку металлолома, расчистку транспортных трактов и т.д.).

4.2. Укомплектовать электрослужбы до установленной численности.

4.3. Усилить контроль за обеспечением безопасной организации работ в электроустановках, для чего до 10 июля 1988 года организовать целевые проверки готовности электрохозяйств для работы в лет-

ний период.

4.4. Копии актов проверок направить в УГЭ комбината до 15 июля.

4.5. Объявить с 1 июля трехмесячник по электробезопасности.

4.6. Ежемесячно рассматривать результаты хода трехмесячника и обеспечить их гласность.

5. С данным распоряжением ознакомить весь электротехнический персонал предприятий под роспись.

Контроль за выполнением возложить на УГЭ комбината.

Главный инженер комбината



А.В. Филатов

Дуклянов
5 33 19

УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

116/353

1/07-86

ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ ГЛАВНОМУ ЭНЕРГЕТИКУ:

АФ УКО РК НЕДВЕЖ ПОВО НОМ МЕХ ЭД ТНРК ВДХ НОРС ПОСРД ГРУ
НШСТ РК КОРСОН НЗ МЗ УЖД УТ Н/БЫТ УОР СВЯЗН ТОО РК ОКТАБ
УУИИГО ПТБ НЗР НГО ЭКГРЗ УАДИС =

25 ИЮНЯ СЕГО ГОДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТИ ТОКОПРИЕМНИКА ЭЛЕКТРОПОЕЗДА БЫЛ СМЕРТЕЛЬНО ТРАВМИРОВАН ЭЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЙ СЕТИ (КС) УЖД ВОЛКОВ А.Д., 1951 ГОДА, 4 ГРУППА ПО ТБ, 5 РАЗРЯД СТАЖ РАБОТЫ 20 ЛЕТ.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ:

НА ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ НА СТ. КАЙЕРКАН ПРОИЗОШЛА ПОЛОМКА РАСПОЛОЖЕННОГО НА КРЫШЕ ВАГОНА ТОКОПРИЕМНИКА. НАХОДИВШИЙСЯ НА СТАЦИИ ВОЛКОВ ОШИБОЧНО ОПРЕДЕЛИЛ, ЧТО ЭЛЕКТРОПОЕЗД НАХОДИТСЯ ПОД ФИДЕРОМ П-1 ТЯГОВОЙ ПУСТ 107 И ДАЛ ЗАЯВКУ ДИСПЕТЧЕРУ КОНТАКТНОЙ СЕТИ (КС) НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭТОГО ФИДЕРА. ФАКТИЧЕСКИ ЭЛЕКТРОПОЕЗД НАХОДИЛСЯ ПОД Ф.П-3. ДИСПЕТЧЕР КС ЧЕРЕЗ ДИСПЕТЧЕРА ПОВО ОТКЛЮЧИЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф.П-1 И ДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ВОЛКОВУ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТИ

ТОКОПРИЕМНИКА. ВОЛКОВ НЕ ВЫПОЛНИЛ ПРОВЕРКУ ОТСУТСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ПРОХОДЯЩИЙ НАД МЕСТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ КОНТАКТНЫЙ ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ 3300 В Ф.П-3 П/СТ 107, ПОДНЯЛСЯ НА КРЫШУ ВАГОНА И БЫЛ СМЕРТЕЛЬНО ТРАВМИРОВАН.

ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ:

1. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТРАДАВШИМ ПРОВЕРКИ ОТСУТСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЯ И НАЛОЖЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА МЕСТЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
2. ОТКЛЮЧЕНИЕ Ф.П-1 ВМЕСТО Ф.П-3 П/СТ 107 ПО ОШИБОЧНОЙ ЗАЯВКЕ ПОСТРАДАВШЕГО.
3. НАХОЖДЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО В СОСТОЯНИИ ЛЕГКОГО АЛКОГОЛЬНОГО ПОПЬЯНЕНИЯ

ПРОШУ ПРОРАБОТАТЬ В ДЕСЯТИДНЕВНЫЙ СРОК ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ СО ВСЕМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ЗАПИСЬЮ В ЛИЧНЫХ КАРТАХ ИНСТРУКТАЖА И УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАБОТАХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ.

УГЗ ЛУКЬЯНОВ И

ПУНКТ ПЕРВЫЙ ЧИТАТЬ ПОЛОЖЕНИЯ

УПП УС

Предприятие

Стройкомплект

Протокол испытания кабеля № 26

Тип кабеля ААБЛГ-6 3x40 с-100м от РП-704 сч.5 до сч. А, Р.5 РП-704

Произведено испытание повышенным напряжением постоянного тока от кенотронной установки АИИ
— 70 зав. № 2445

Напряжение прикладывалось к каждой жиле в отдельности при двух других заземленных на жилу кабеля

Прилагаемое напряжение в КВ

ток утечки по фазам в МКА

26 - 30

3 - 30

10 - 30

Назв. сокрот. издателя жил кабеля
происх. прибора Р-4102/2
№ 011502

Время приложения напряжения 5 мин.

Сопротив. изоляции д/испытания 1000 Мом.

Сопротив. изоляции п/испытания 1000 Мом.

Заключение:

кабель испытанного выдерживает

Испытание производил: Войт / Бондаренко

Испытание производил:

Начальник лаборатории: Войт / Бондаренко

«11» сентяб 1981 г.

ТНК-8551-3x1000.

ТСН

Предприятие

Стройкомплект

ПРОТОКОЛ Р 24

Проверки целостности жил кабеля ААБЛГ-6 3x40

с-100м от сч. А16 Р.2.5 до сч. А18 Р.2.5 РП-704

Жила

Измерение

Результат

А

А-0

испробовано

В

В-0

испробовано

С

С-0

испробовано

Измерение производился прибором И-372

зав. № 015932

Поверен И.С. 80

Измерение производил:

Войт / Бондаренко

Начальник лаборатории:

Войт / Бондаренко

«11» сентяб 1981 г.

ТСК

Предприятие Стройкомплект

ПРОТОКОЛ № 25

Проверки целостности жил кабеля АББЛГЧ-6 3х40
с-100м от РП-407-24.5 до ст. А1. кабель № 925
РП-402

Жила	Измерение	Результат
А	А-0	непробито
В	В-0	непробито
С	С-0	непробито

Измерение производилось прибором И-372

зав. № 019432

Проверен 11 к. 90

Измерение производил: Бойко / Боксеевский

Начальник лаборатории: Ромашкин

" 11 " марта 1991 г.

ТСК
Предприятие Уз-и м 7 Бел

ПРОТОКОЛ № 7
Испытания средств защиты

№ п/п Наименование средств защиты Испытан. напряжение, кВ Дата
переменного тока след. испытан

1 Устройства марки ГИИ-90-4 кВ. 20 кВ до 0,5 кВ 9.04.1992

Испытание проводил:

Начальник лаборатории:

" " 1991 г.

Бойко / Боксеевский
Ромашкин

УПП УС

Предприятие

СтройкоммундПротокол испытания кабеля № 28Тип кабеля НАБЛГ-6 3x40 е-120 от оп. А18 9-5 РП-702 до оп. А18 9-5 РП-702

Произведено испытание повышенным напряжением постоянного тока от кенотронной установки АИИ

— 70 зав. № 2441

Напряжение прикладывалось к каждой жиле в отдельности при двух других заземленных на жилу кабеля

Прилагаемое напряжение в КВ ток утечки по фазам в МКА

№ - 303 - 30к - 30Изм. сопротив. изоляции жил кабеля
произв. прибором Ф-4102/2
№ 011502 изв. д.ав. 80

Время приложения напряжения

5 мин

Сопротив. изоляции д/испытания

1000 Мом

Сопротив. изоляции п/испытания

1000 Мом

Заключение:

кабель испытание выдержал

Испытание производил:

Васильев / Бонегорский

Испытание производил:

Начальник лаборатории:

Федотов / Ромашенко«11» марта 1981 г.

ТНК-8551-3x1000.

УПП УС

Предприятие

СтройкоммундПротокол испытания кабеля № 30Тип кабеля НАБЛГ-6 3x40 е-70 от оп. А18 9-5 РП-702 до оп. А20 9-5 РП-702

Произведено испытание повышенным напряжением постоянного тока от кенотронной установки АИИ

— 70 зав. № 2441

Напряжение прикладывалось к каждой жиле в отдельности при двух других заземленных на жилу кабеля

Прилагаемое напряжение в КВ ток утечки по фазам в МКА

№ - 303 - 30к - 30

Время приложения напряжения

5 мин

Сопротив. изоляции д/испытания

1000 Мом

Сопротив. изоляции п/испытания

1000 МомИзм. сопротив. изоляции жил кабеля
произв. прибором Ф-4102/2
№ 011502 изв. д.ав. 80

Заключение:

кабель испытание выдержал

Испытание производил:

Васильев / Бонегорский

Испытание производил:

Начальник лаборатории:

Федотов / Ромашенко«11» марта 1981 г.

ТНК-8551-3x1000.

УПП УС

Предприятие

СтройкомплектПротокол № 14Испытания эл.оборудования повышенным напряжением переменного тока от кенотронной установки АИИ — 70 зав. № 244Нет. РЛНД-6/400 для установки на ст. Аз 9.5 РП-702

Напряжение прикладывалось пофазно:

Фаза	Сопротив. изоляции д/испытания	Испытан. в КВ	Сопротивление изоляции п/испытания	Время
Ж	2000 мом	32	2000 мом	1 мин
З	2000 мом	32	2000 мом	1 мин
К	2000 мом	32	2000 мом	1 мин

Под испытательным напряжением находилось след эл. оборудование:

Изм. сопрот. изоляции оборуд.
производился прибором Ф-4100/2
N 011502 кв. 5 кв. 10

Изоляторы проходные: _____

Изоляторы опорные: _____

Трансформаторы тока: _____

Масляные выключатели: _____

Разъединители: _____

Заключение: РЛНД-6/400 испытание выдержало

Испытание производил:

Испытание производил:

Начальник лаборатории:

«25» февраля 1989 г.

ТНН-8551-3x1000

УПП УС

Предприятие

СтройкомплектПротокол № 13Испытания эл.оборудования повышенным напряжением переменного тока от кенотронной установки АИИ — 70 зав. № 2445Нет. РЛНД-6/400 Ячейка для установки на ст. Аз 9.5 РП-702

Напряжение прикладывалось пофазно:

Фаза	Сопротив. изоляции д/испытания	Испытан. в КВ	Сопротивление изоляции п/испытания	Время
Ж	2000 мом	32	2000 мом	1 мин
З	2000 мом	32	2000 мом	1 мин
К	2000 мом	32	2000 мом	1 мин

Под испытательным напряжением находилось след эл. оборудование:

Изм. сопрот. изоляции оборуд.
производился прибором Ф-4100/2
N 011502 кв. 5 кв. 10

Изоляторы проходные: _____

Изоляторы опорные: _____

Трансформаторы тока: _____

Масляные выключатели: _____

Разъединители: _____

Заключение: РЛНД-6/400 испытание выдержало

Испытание производил:

Испытание производил:

Начальник лаборатории:

«25» февраля 1989 г.

ТНН-8551-3x1000

ТСК

Предприятие Стройкомплекс

ПРОТОКОЛ № 24

Замера сопротивления изоляции эл. оборудования

Место установки Щит-04кв КТМ-11
Р. 150 кв

Сопротивление в МОМ

А-В	1000
А-С	1000
В-С	1000
А-О	500
В-О	500
С-О	500

Измерение производилось прибором Ф-4102/зав. № 003649
нон. 1984 г.Измерение производил: В. Ф. / БонеганскийНачальник лаборатории: В. Ф. / Бонеганский" 11 " февр 1984 г.

УПП УС

Предприятие Стройкомплекс

Протокол № 15

Испытания эл. оборудования повышенным напряжением переменного тока от кенотронной установки АИИ — 70 зав. № 2245Изоляторы ШС-10 78 шт. Точка РС-70А 144 шт. для установки на Ф-5
РН-704

Напряжение прикладывалось пофазно:

Фаза	Сопротив. изоляции д/испытания	Испытан. в КВ	Сопротивление изоляции п/испытания	Время
Ж	<u>ср. 2500 мом</u>	<u>32</u>	<u>ср. 2500 мом</u>	<u>1 мин.</u>
З				
К				

Под испытательным напряжением находилось след. эл. оборудование:

Изм. электр. измерит. оборуд.
испыт. прибором Ф-4102/з
нон. 1984 г.Изоляторы проходные: _____
Изоляторы опорные: _____
Трансформаторы тока: _____
Масляные выключатели: _____
Разъединители: _____Заключение: ШС-10 78 шт. и РС-70А 144 шт. испытание выдержалиИспытание производил: В. Ф. / БонеганскийИспытание производил: В. Ф. / БонеганскийНачальник лаборатории: В. Ф. / Бонеганский«20» февр 1984 г.

УПП УС
Предприятие

Среднекомбинат

Протокол № 69

Проверки сопротивления заземления эл. оборудования на связь с контуром заземления.

Место установки: КТПН N 11

№ п.п.	Наименование эл. оборудования	Сопротив. в Ом
	Тр-р S-180кВ	0,035
	Индуктор точки тр-р	0,035
	Заземление по контуру	
	КТПН N 11 с заземл.	
	МГ-35	

Измерение производилось прибором: Р-333 мод. Б.кв. 90

зав. № 05523

Измерение производил:

Начальник лаборатории:

Байра / Ромашинский
ТНН-8549-2х1000.

УПП УС
Предприятие

Среднекомбинат

Протокол № 68

Проверки сопротивления заземления эл. оборудования на связь с контуром заземления.

Место установки: карьер "Пригоссовский"

№ п.п.	Наименование эл. оборудования	Сопротив. в Ом
	КТПН N 11 S-180кВ	0,03
	Заземление было про-	
	ведено по контуру	
	от местного контура	
	заземления	

Измерение производилось прибором: Р-333 мод. Б.кв. 90

зав. № 05523

Измерение производил:

Начальник лаборатории:

Байра / Ромашинский
ТНН-8549-2х1000.

Протокол № 42

Проверки сопротивления заземления эл. оборудования на связь с контуром заземления.

Место установки: корпус "Притрессовки"
ВЛ-6КВ 9.5 РП-107 рп. А42

[illegible]

Измерение производилось прибором: Р-333 из в. ГИИ. 90

Зав. № 05523

Измерение производил: Бел. / Бр... 7.03.81

Начальник лаборатории:

THK-8549-2x1000.

Протокол № 40

Проверки сопротивления заземления эл. оборудования на связь с контуром заземления.

Место установки: картер Припрессован
ВЛ-6кВ 92.5 РР-408 об. А.9

[illegible]

Измерение производилось прибором: P-333 кв. II кв. 80

Зав. № 05523

Измерение производил: Бонд. Г.

Начальник лаборатории:

Начальник лаборатории: *В. К. 12* ТНК-8549-2х1000

УПП УС

Предприятие

С/ОбкомплектПротокол № 12Испытания эл.оборудования повышенным напряжением переменного тока от кенотронной установки АИИ — 70 зав. № 2875Ист. РАИД-6/400 гидроэлектростанция на ст. Ачд 9-5 РН-807

Напряжение прикладывалось пофазно:

Фаза	Сопротив. изоляции д/испытания	Испытан. в КВ	Сопротивление изоляции п/испытания	Время
Ж	<u>2000 МОМ</u>	<u>32</u>	<u>2000 МОМ</u>	<u>1 мин</u>
З	<u>2000 МОМ</u>	<u>32</u>	<u>2000 МОМ</u>	<u>1 мин</u>
К	<u>2000 МОМ</u>	<u>32</u>	<u>2000 МОМ</u>	<u>1 мин</u>

Под испытательным напряжением находилось след. эл. оборудование:

Изм. сопрот. изоляции оборуд.
процесс. прибором Ф-4102/2
№ 011502 изв. Б.К. 80

Изоляторы проходные: _____

Изоляторы опорные: _____

Трансформаторы тока: _____

Масляные выключатели: _____

Разъединители: _____

Заключение: РАИД-6/400 испытание выдержки

Испытание производил:

Испытание производил:

Начальник лаборатории:

«25» декабрь 1981 г.

ТНК-8551-3x1000.

УПП УС

Предприятие СтройкомплексПротокол № 16Испытания эл. оборудования повышенным напряжением переменного тока от кенотронной установки АИИ — 70 зав. № 244П/ст. КТПЧ № 11 3-180 кв Ячейка РЧ-6 кв

Напряжение прикладывалось пофазно:

Фаза	Спротив. изоляции д/испытания	Испытан. в КВ	Спротивление изоляции п/испытания	Время
Ж	<u>2000 мом</u>	<u>32</u>	<u>2000 мом</u>	<u>1 мин</u>
З	<u>2000 мом</u>	<u>32</u>	<u>2000 мом</u>	<u>1 мин</u>
К	<u>2000 мом</u>	<u>32</u>	<u>2000 мом</u>	<u>1 мин</u>

Под испытательным напряжением находилось след эл. оборудование:

Изм. сопротив. изоляции оборуд.
пробр. прибором Р-4102/2
№ 011502 кв. 5 кв. 80

Изоляторы проходные: -
Изоляторы опорные: 6 шт.
Трансформаторы тока: -
Масляные выключатели: -
Разъединители: РВ-6/250

Заключение: оборудование исправное выдержало

Испытание производил:

Испытание производил:

Начальник лаборатории:

«11» нояб 1984 г.

ТНК-8551-3х1000.

УПП УС

Предприятие СтройкомплексПротокол № 17Испытания эл. оборудования повышенным напряжением переменного тока от кенотронной установки АИИ — 70 зав. № 244П/ст. ЯКЧО-6 № 5 Ячейка РЧ-6 кв

Напряжение прикладывалось пофазно:

Фаза	Спротив. изоляции д/испытания	Испытан. в КВ	Спротивление изоляции п/испытания	Время
Ж	<u>1000 мом</u>	<u>32</u>	<u>1000 мом</u>	<u>1 мин</u>
З	<u>1000 мом</u>	<u>32</u>	<u>1000 мом</u>	<u>1 мин</u>
К	<u>1000 мом</u>	<u>32</u>	<u>1000 мом</u>	<u>1 мин</u>

Под испытательным напряжением находилось след эл. оборудование:

Изм. сопротив. изоляции оборуд.
пробр. прибором Р-4102/2 № 011502
кв. 5 кв. 80.

Изоляторы проходные: 3 шт.
Изоляторы опорные: 6 шт.
Трансформаторы тока: 2 шт.
Масляные выключатели: ВМ-10
Разъединители: РВЗ

Заключение: оборудование исправное выдержало

Испытание производил:

Испытание производил:

Начальник лаборатории:

« » нояб 1984 г.

ТНК-8551-3х1000.

Протокол № 73

Проверки сопротивления заземления эл. оборудования на связь с контуром заземления.

Место установки: кюрьер "Пригласительный"

[illegible]

Измерение производилось прибором: Р-333 нав. Бкв. 90

Зав. № 05523

Измерение производил: Бонф./Бонгеровский
Начальник лаборатории: _____

Начальник лаборатории:

Начальник лаборатории: ТНК-8549-2x1000.

Протокол № 26

Проверки сопротивления заземления эл. оборудования на связь с контуром заземления.

Место установки: карьер Пригоровский
ВА-6КВ 915 РР-104 Оп. 142

[illegible]

Измерение производилось прибором: P-333 ИИС БКЛ 80

Зав. № 05523

Измерение производил: Байт. Гомельский 11.03.91

Измерение производил: Б. С. 1. Б. С. 1. Б. С. 1. 11.03.91

Начальник лаборатории: *Васильев*

Начальник лаборатории: *Д. П. ...* ТНК-8549-2x1000.

ТСК

Предприятие Обр.ком.м.с.г.

ПРОТОКОЛ № 28

Проверки целостности жил кабеля ААБ.Г.У-6 3х40

с-70м от ст. А.В. 9.5 до ст. А.20 9.5 РД-408

Жила	Измерение	Результат
А	А-О	испробовано
В	В-О	испробовано
С	С-О	испробовано

Измерение производился прибором И-372

зав. № 018832

Поверен Д.в. 80

Измерение производил: Б.С. Г. / Б.С. Г. /

Начальник лаборатории: Б.С. Г. / Б.С. Г. /

" 11 " ноябрь 1990 г.

П А С П О Р Т

ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ линии электропередачи

6

KB.

отработка №3 Ф29 ГИИ-57.

(наименование линии)

1	Год постройки	1973
2	Балансовая стоимость	8246
3	Инвентарный №	1001
4	Наименование строительно-монтажной организации	Лесхоз сов. Ефремов ГРУ

1. Основные данные

	Длина линии	1800 м	к.	9	Соединители провода (тип)	COC
2	Опоры:			10	Демпферы (тип)	—
	деревянные	34	шт.	11	Марка троса	—
	металлические	—	шт.		(начало и конец, № опор и длина)	
	железобетонные	—	шт.	12	Способ скрепления троса	(глухое изолирование)
3	Марка провода	AC-50		13	Соединение троса (тип)	—
4	Длина пролета:			14	Тип разрядников	
	максимальная	70	м	15	№ опор с разрядниками	
	минимальная	50	м	16	Переключательные пункты и их местонахождение:	РАНД N1 от N1; РАНД N2. ЯКНО N3 от N2; крайнее ГПТ-57; РАНД N-7 от N26.
	расчетная	—	м			
5	Стрела провеса			17	Ответвления: их длина и местонахождения:	У6; У12; П20; А26; П29; П34.
	от	0,92	м до			
		0,65	м			
6	Число цепей на опоре	одна				
7	Тип изоляторов	ПС-6А; ШС-е-10				
8	Тип арматуры:			18	Климатические условия:	(район, дополнительные сведения)
	натяжная	HБ-1				тн. голошердкий р-он
	подвесная					тн. по створам восточно- — район Вейра тн. по ширине степи год. 98
